Budapest-Kelenföld (01024) állomás vázlatos helyszínrajza

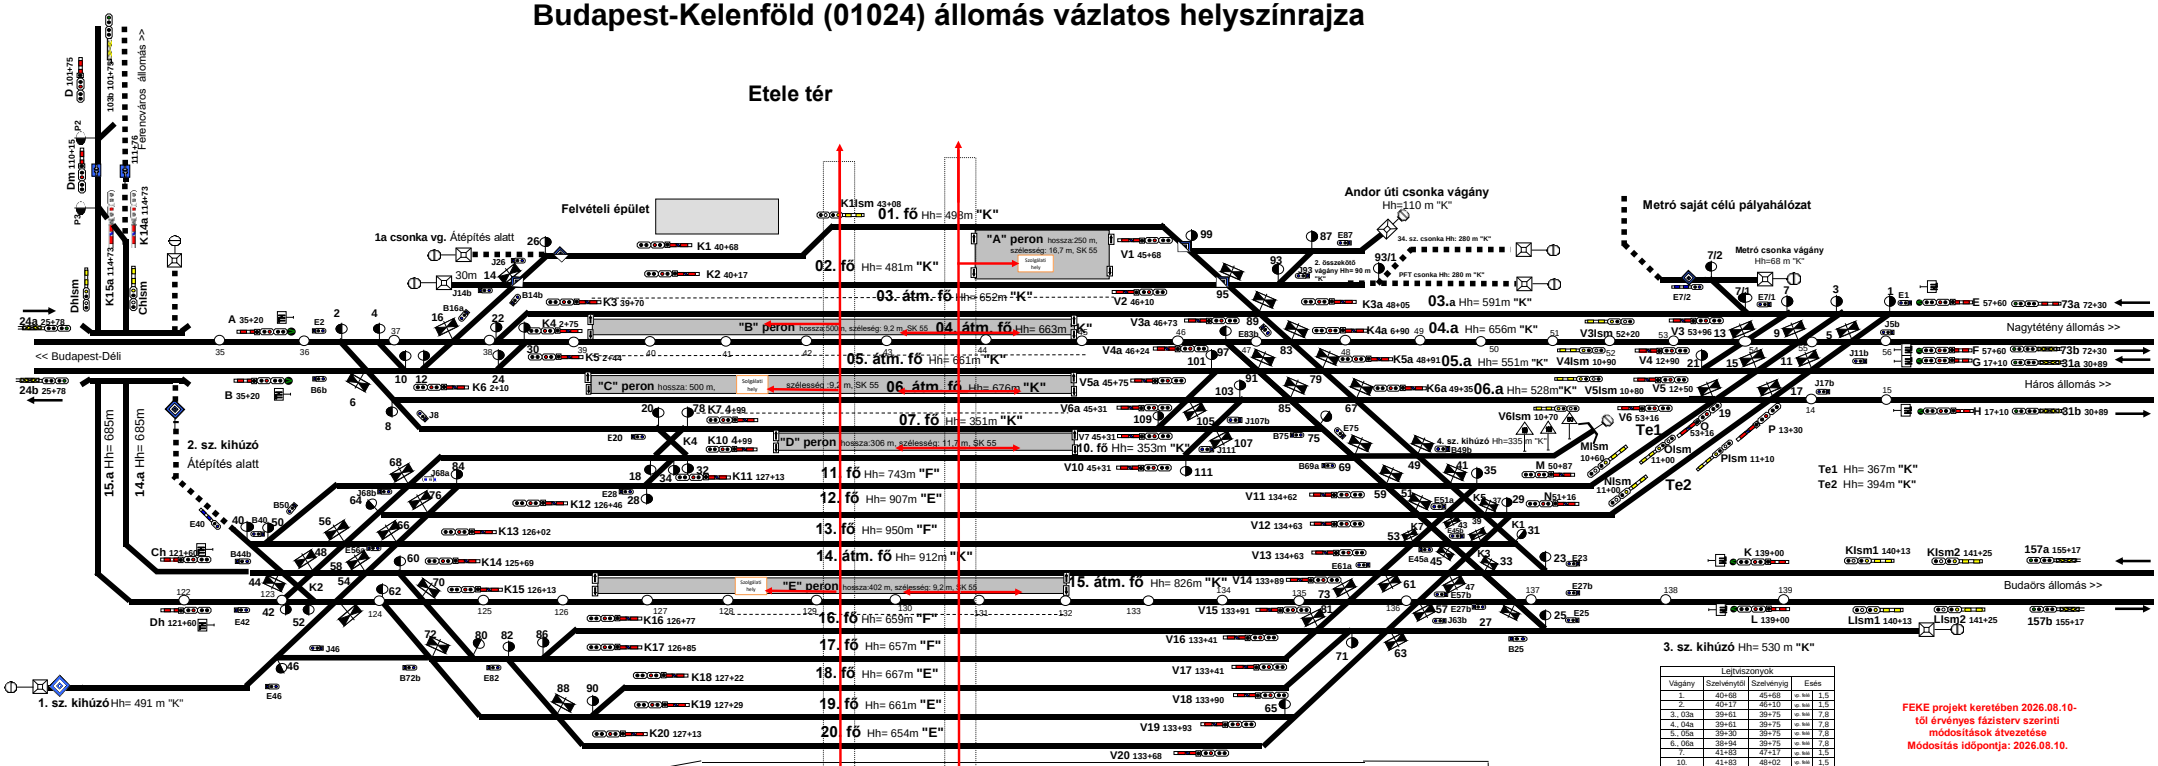

Peron	Szelvény száma
A	43+11 - 45+61
B	39+58 - 44+58
C	39+58 - 44+99
D	41+93 - 44+99
E	126+30 - 130+96

Átvezetési terhelés	Szelvény száma
2-3. vágány	39+64 - 44+70
4-5. vágány	39+52 - 44+70
6-7. vágány	41+53 - 44+70
15-16. vágány	129+00 - 131+10

Váltó száma	Szelvény száma	Váltó száma	Szelvény száma
2	36+53	64	124+50
4	36+98	66 a/b	124+97
6 a/b	37+26	68 a/b	125+08
8	38+11	70 a/b	125+08
10	37+71	72 a/b	125+09
12	37+78	76 a/b	125+42
14 a/b	39+98	78	41+76
16 a/b	38+41	80	125+64
18	125+89	82	125+64
20	40+09	84	125+96
22	38+75	86	126+12
24	38+74	88 a/b	126+19
26	40+60	90	126+56
28	126+31		
30	39+54		
32	127+57		
34	127+38		
40	122+38		
42	122+95		
44 a/b	123+06		
46	123+29		
48 a/b	123+51		
50	122+95		
52	123+62		
54 a/b	123+85		
56 a/b	125+18		
58 a/b	124+30		
60	124+47		
62	124+47		

Váltó száma	Szelvény száma	Váltó száma	Szelvény száma
1	55+15	57 a/b	135+15
3	54+71	59 a/b	134+92
5 a/b	13+80	61 a/b	134+70
7	54+28	63 a/b	134+71
7/1	53+78	65	134+52
7/2	52+91	67 a/b	7+90
9 a/b	13+60	69 a/b	137+47
11 a/b	13+65	71	134+35
13 a/b	13+15	73 a/b	134+25
15 a/b	13+50	75	133+98
17 a/b	13+40	79 a/b	7+20
19 a/b	13+15	81 a/b	133+80
21	12+80	83 a/b	6+75
23	137+56	85 a/b	7+10
25	137+50	87	47+12
27 a/b	136+94	89 a/b	46+83
29	136+82	91 a/b	7+04
31	136+82	93	46+50
33 a/b	136+49	93/1	47+91
35	136+37	95 a/b	46+28
37 a/b	136+28	97	6+60
39 a/b	137+27	99	45+72
41 a/b	135+82	101	132+96
43 a/b	135+82	103	132+96
45 a/b	135+82	105	132+33
47 a/b	135+59	107	132+33
49 a/b	135+50	109	131+73
51 a/b	135+37	111	131+73
53 a/b	135+37		
Ideiglenes váltók:		P2	109+49
		P3	113+32

Lejtviszonyok			
Vágány	Szelvénytől	Szelvényig	Esés
1.	40+68	45+68	ip. kw.	1,5
2.	40+17	46+10	ip. kw.	1,5
3., 03a	39+61	39+75	ip. kw.	7,8
4., 04a	39+61	39+75	ip. kw.	7,8
5., 05a	39+30	39+75	ip. kw.	7,8
6., 06a	38+94	39+75	ip. kw.	7,8
7.	41+83	47+17	ip. kw.	1,5
10.	41+83	48+02	ip. kw.	1,5
11.	126+63	134+62	ip. kw.	1,7
12.	126+63	135+08	ip. kw.	1,7
13.	126+63	135+12	ip. kw.	1,7
14.	126+63	134+39	ip. kw.	1,7
15.	126+63	133+91	ip. kw.	1,5
16.	126+27	133+41	ip. kw.	1,5
17.	126+53	133+41	ip. kw.	1,5
18.	127+22	133+90	ip. kw.	1,5
19.	127+23	133+93	ip. kw.	1,5
20.	126+17	133+68	ip. kw.	1,5
Te1	50+95	52+61	ip. kw.	5,1
Te2	50+95	53+46	ip. kw.	5,1

FEKE projekt keretében 2026.08.10-tól érvényes fázisterv szerinti módosítások átvezetése
Módosítás időpontja: 2026.08.10.
